Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Муниципальное казённое учреждение культуры «Чернянская центральная районная библиотека»

«Адаптация маломобильных групп населения Чернянского района в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам»

Директор муниципального казенного учреждения культуры
«Чернянская центральная районная библиотека»
Стороженко Юлия Валерьевна

Чернянка, 2018 год

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

На территории Чернянского района проживает 31 488 человек. Статистический анализ показал, что на конец 2017 года в районе проживает 5405 человек с ограничениями жизнедеятельности, из них 171 инвалид по зрению, 44 по слуху, 128 – опорно-двигательный аппарат и 99 детей-инвалидов.

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

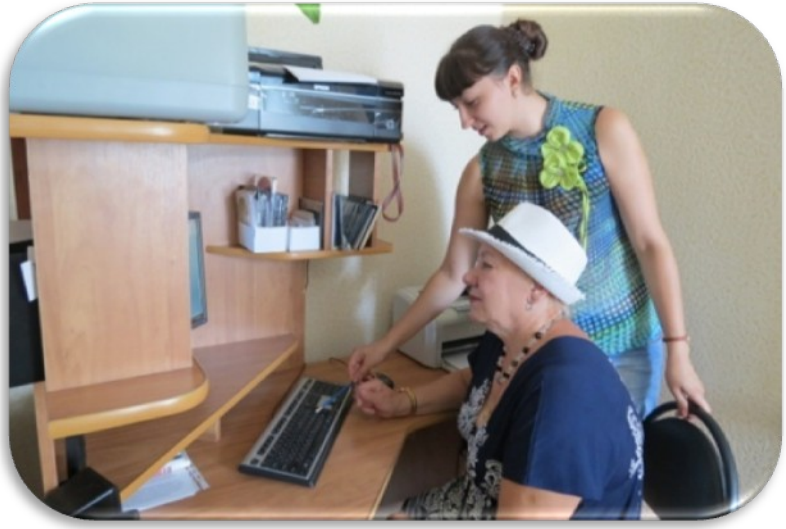

Цель и результат проекта

Цель проекта:	Оказание библиотечных услуг людям с ограничениями жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского района не менее 1000 человек к июлю 2019 года.
Способ достижения цели:	1. Обслуживание на дому людей с ограничениями жизнедеятельности и старшего возраста. 2. Создание внестационарного пункта выдачи литературы на базе ОГРБУЗ «ЧЦРБ»
Результат проекта:	Внедрение не менее 2 форм библиотечного обслуживания
Требования к результату:	1. Подготовка и издание нормативно-распорядительных документов . 2. Проведение не менее 5 онлайн-трансляций культурно-массовых мероприятий библиотек для маломобильных групп пользователей. 3. Предоставление услуги «говорящая книга» не менее 100 экземпляр для обслуживания людей с нарушениями зрения 4.Организация не менее 20 онлайн – консультаций. 5. Приобретение не менее 100 экземпляров книг и периодических изданий 6. Отражение деятельности проекта не менее 5 статей на сайтах управления культуры, МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
Пользователи результата проекта:	Маломобильные группы населения Чернянского района

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

введение новой услуги «говорящая книга» для обслуживания людей с нарушениями зрения

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

использование возможностей Центра общественного доступа (ЦОД);

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

открытие пункта внестационарного обслуживания на базе Чернянской центральной районной больницы

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

онлайн-трансляция культурно-массовых мероприятиях библиотек для маломобильных групп пользователей



Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год								2019 год						
					05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1	Подготовка и издание нормативно-распорядительных документов	30	15.05.2018	27.06.2018															
1.1	Подготовка приказа об открытии пункта внестационарного обслуживания на базе ОРГБУЗ «ЧЦРБ»	15	21.05.2018	8.06.2018															
1.2	Договор на организацию библиотечного пункта выдачи литературы специальных форматов из фонда БГСБС им. В.Я. Ерошенко	15	21.05.2018	8.06.2018															
1.3	Договор поставки периодических печатных изданий ФГУП «Почта России»	32	4.06.2018	19.07.2018															
2.	Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности	238	20.06.2018	25.06.2019															
2.1	Принятие заявок на надомное библиотечное обслуживание	279	21.05.2018	25.06.2019															
2.2	Надомное обслуживание	279	21.05.2018	25.06.2019															
2.3	Предоставление услуги «говорящая книга» для обслуживания людей с нарушениями зрения не менее 100 экземпляр	265	8.06.2018	25.06.2019															
2.4	Внестанционарное обслуживание на базе ОРГБУЗ «ЧЦРБ»	265	8.06.2018	25.06.2019															
3	Центр общественного доступа (ЦОД) для маломобильных групп населения	279	21.05.2018	25.06.2019															
3.1	Оказание Онлайн –консультаций	279	21.05.2018	25.06.2019															
3.2	Индивидуальное информирование	279	21.05.2018	25.06.2019															

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год								2019 год						
					05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
4.	Массовая работа	265	08.06.2018	25.06.2019															
4.1	Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий библиотек для маломобильных групп пользователей с использованием онлайн-трансляции.	93	12.11.2018	14.03.2019															
4.2	Участие надомников в областных , районных фестивалях и конкурсах	263	13.06.2018	25.06.2019															
5.	Пополнение фонда МКУК «ЧЦРБ»	186	21.05.2018	25.06.2019															
5.1	Приобретение книг	63	3.09.2018	25.03.2019															
5.2	Подписка на периодические издания	123	21.05.2018	25.06.2019															
6.	Отражение деятельности проекта на сайтах управления культуры, МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» - не менее 5	313	21.05.2018	25.07.2019															
6.1	Информация на сайтах управления культуры, чернянской центральной районной библиотеке.	313	21.05.2018	25.07.2019															
	Итого:	313	15.05.2018	25.07.2019															

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовка и издание нормативно-распорядительных документов	-	-	-	-	-	-	-
2.	Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности	-	-	-	-	-	-	-
3.	Центр общественного доступа (ЦОД) для маломобильных групп населения	-	-	-	-	-	-	-
4.	Массовая работа	-	-	-	-	-	-	-
5.	Пополнение фонда МКУК «ЧЦРБ»	**300,0**	-	-	300,0	-	-	-
6.	Отражение деятельности проекта на сайтах управления культуры, МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» - не менее 5	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		**300,0**	-	-	300,0	-	-	-

Формы Участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		**Размер участия бюджета, тыс. руб.**		
		Федеральный	**Областной**	**Местный**
Прямое бюджетное финансирование	Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020 гг.»			300,0
Дороги[13]	Указать плановую протяженность			
Субсидии[13]	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				300,0

Программы государственной поддержки				
Потребность		**Финансовые вложения, тыс. руб.**		
Электроэнергия[13]	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение[13]	Указать требуемый объем			
Водоснабжение[13]	Указать требуемый объем			
Гарантии[13]				
Залоги[13]				
Прочие формы участия[13]				
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

[13] необходимо указать основание выделения денежных средств

Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта

1	**Социальная эффективность**		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	**1,0**
1.2	Новые рабочие места	Ед.	**-**
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	**-**
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	**-**
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	**-**
1.6	*Иные показатели*		-
2	**Бюджетная эффективность**		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	**Экономическая эффективность**		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	*Иные показатели*		

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Гопалов Анатолий Николаевич	Начальник управления культуры администрации района	Куратор проекта / Контроль за исполнением проекта
2.	Стороженко Юлия Валерьевна	Директор МКУК "Чернянская ЦРБ"	Руководитель проекта / Согласует и утверждает ход реализации Проекта
3.	Андреева Рано Джамолидиновна	Заведующая отделом по работе с инвалидами МКУК «Чернянская ЦРБ»	Администратор проекта / Информирует и выполняет мероприятия по проекту
4.	Столбова Ольга Ивановна	Заведующая отделом комплектования МКУК "Чернянская ЦРБ"	Исполнитель проекта/ Пополнение фонда МКУК "Чернянская ЦРБ"
5.	Ломакина Светлана Васильевна	Заведующая Центра правовой информации МКУК "Чернянская ЦРБ"	Исполнитель проекта/ Оказание онлайн-консультаций
6.	Незнамова Елена Александровна	Библиотекарь внестационарного обслуживания МКУК "Чернянская ЦРБ"	Исполнитель проекта / Внестанционарное обслуживание на базе ОРГБУЗ «ЧЦРБ»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна

Тел.: 8(47232)5-56-65

E-mail: biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Андреева Рано Джамолидиновна

Тел.: 8(47232)5-56-65

E-mail: biblioteka16@yandex.ru
